



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 20 septembrie 2023
(OR. en)

13215/23
ADD 1

ECOFIN 902
FIN 937
UEM 250

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă: Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare

Data primirii: 19 septembrie 2023

Destinatar: Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene

Subiect: ANEXĂ
la
RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI
CONSILIU
privind implementarea Mecanismului de redresare și reziliență: calea de
urmat

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 1/2.



Bruxelles, 19.9.2023
COM(2023) 545 final

ANNEX 1 – PART 1/2

ANEXĂ

la

**RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind implementarea Mecanismului de redresare și reziliență: calea de urmat**

ANEXA 1 – Planurile de redresare și reziliență în statele membre ale UE¹

Belgia

Belgia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 23 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 5,9 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Belgia a fost actualizată, de asemenea, la 30 iunie 2022, la 4,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Belgia a prezentat Comisiei, la 20 iulie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, de eficiența energetică și de mobilitatea durabilă. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Belgia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Belgiei urmărește să abordeze principalele provocări legate de mobilitate și de lucrările publice, productivitate, durabilitate și inovare, precum și incluziunea digitală și socială. Acesta constă în 35 de reforme și 105 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 5,9 miliarde EUR, reprezentând 1,2 % din PIB. Au fost adoptate planuri de redresare complementare la diferite niveluri de guvernare. La 3 august 2021, Comisia a plătit Belgiei 770 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Deși planul de redresare și reziliență al Belgiei este în curs de implementare, există însă un risc din ce în ce mai crescut al unor întâzieri. Belgia nu a depus încă o cerere de plată. Va fi necesară o guvernare eficientă pentru a permite o implementare rapidă și constantă.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Belgiei.


¹ În sensul prezentei anexe, toate datele și cifrele sunt prezentate cu data-limită de 1 septembrie 2023, deși informațiile privind stadiul implementării planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre rămân neschimbate față de rapoartele de țară publicate în pachetul din primăvara anului 2023 al semestrului european.

Bursa de valori din Bruxelles a beneficiat de sprijin din partea MRR pentru renovarea sa recent finalizată, ceea ce va conduce la economii semnificative de energie.



Drepturi de autor: Guvernul federal belgian


Figura 1: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Belgia

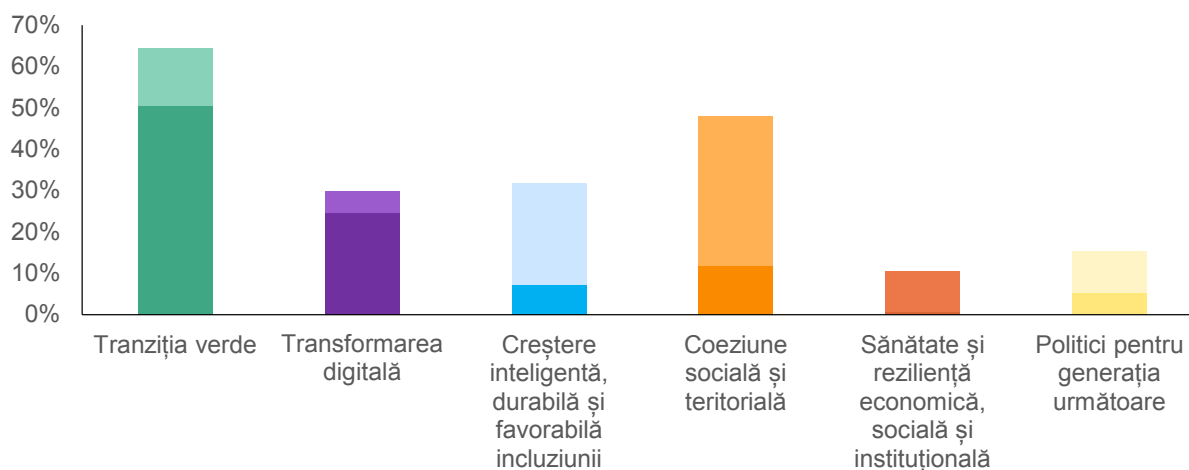

Notă: Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 2: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Belgia



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Bulgaria

Bulgaria și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 15 octombrie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 7 aprilie 2022 și aprobarea de către Consiliu la 28 aprilie 2022 au permis plata a 6,3 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Bulgaria a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 5,7 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentată nicio revizuire a planului.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Bulgariei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și digitală, mediul de afaceri, inclusiv statul de drept, incluziunea socială, accesul la educație, formare și asistență medicală de calitate. Acesta constă în 47 de reforme și 56 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 6,3 miliarde EUR, reprezentând aproximativ 10,2 % din PIB în 2019.

Deși Planul de redresare și reziliență al Bulgariei este în curs de punere în aplicare, există însă un risc din ce în ce mai crescut al unor întârzieri. La 16 decembrie 2022, Bulgaria a prezentat o cerere de plată, care se referă la 22 de jaloane și ținte din plan și presupune o plată în valoare totală de 1,37 miliarde EUR. Cele 22 de jaloane aferente acoperă primii pași importanți în ceea ce privește reformele și investițiile care vizează decarbonizarea sectorului energetic, promovarea implementării la scară largă a infrastructurii digitale, reformarea sistemului judiciar, consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor, digitalizarea sectorului public, consolidarea caracterului adecvat și a acoperirii sistemului de venit minim. Au fost incluse, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că sistemul de audit și control pentru implementarea MRR este conform standardului. Nivelul ridicat de instabilitate guvernamentală a dus la întârzieri în ceea ce privește reformele legislative esențiale, cum ar fi cele privind achizițiile publice, combaterea corupției și răspunderea procurorului general. Lipsa stabilității politice și a capacității administrative s-a tradus, de asemenea, într-o încetinire a activității de punere în aplicare a mai multor investiții importante în domeniul energiei și al transporturilor și prin punerea sub semnul întrebării a unor aspecte-cheie ale planului, și anume decarbonizarea sectorului energetic. Noul guvern a stabilit ca prioritate implementarea planului. Transmiterea celei de a doua cereri de plată a fost amânată și se prevede în prezent să fie efectuată în toamna anului 2023. Cu toate acestea, există un risc semnificativ ca mai multe obiective de etapă și ținte legate de reformele-cheie să nu fie atinse când se va trimite cererea. Lucrările privind addendumul la plan și capitolul privind REPowerEU sunt în curs, dar ar trebui accelerate, menținând în același timp accentul pe punerea în aplicare. Din cauza situației politice, este încă neclar când poate fi finalizată această activitate.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Bulgaria și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Bulgaria

➤ Reformă

Bulgaria a lansat o reformă care vizează îmbunătățirea caracterului adecvat și a acoperirii sistemului său de venit minim. Prin adoptarea modificărilor legislative relevante, Bulgaria a introdus o creștere treptată între 2022 și 2024 a pragurilor de venit pentru toți potențialii beneficiari ai sistemului de venit minim. Acesta este un pas important în abordarea provocărilor sociale de lungă durată din țară.

➤ Investiție


Bulgaria a început construcția unui tronson de pe linia 3 a metroului din Sofia pe o lungime totală de 3 km, acoperind 3 stații. Acesta va asigura un serviciu de transport public curat, rapid și eficient pentru pasagerii cu conexiuni intermodale. Se preconizează că investiția va permite transportul a 7,6 milioane de pasageri pe an, în medie, începând din 2026. Prin îmbunătățirea transportului public pentru locuitorii orașului, se preconizează că acest proiect va duce la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului, precum și la o reducere a numărului de autoturisme aflate în circulație în oraș. Contractele privind lucrările de construcții au fost semnate, iar punerea în aplicare este în curs.

Stația Universitatea de Medicină pe linia de metrou 3



Drepturi de autor: Guvernul bulgar


Figura 3: Plată per pilon – Bulgaria

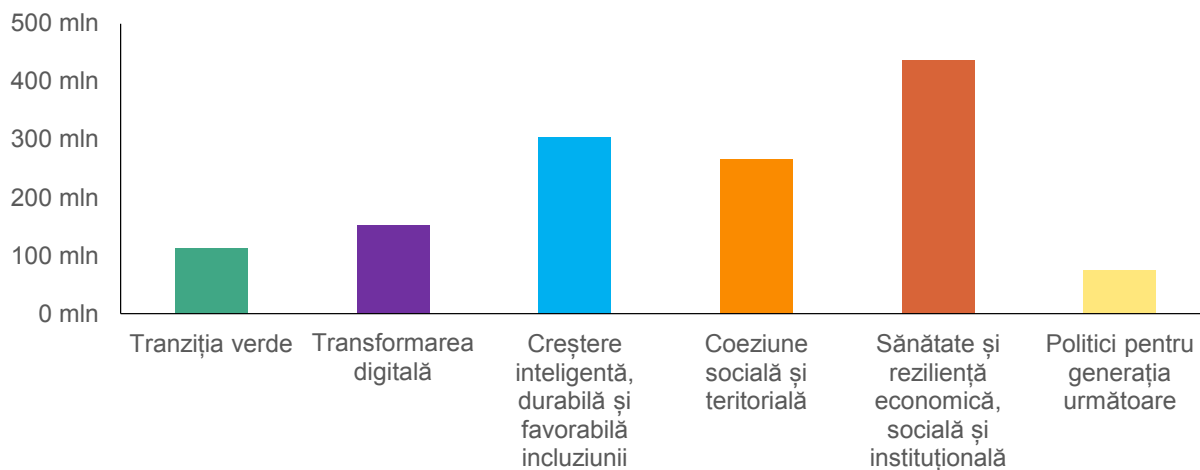

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 4: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Bulgaria



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 5: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Bulgaria

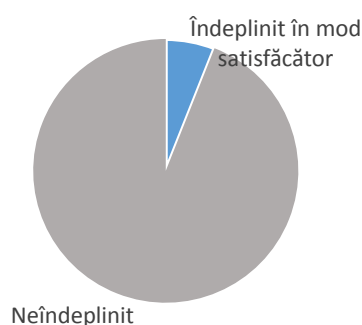

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Cehia

Cehia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 1 iunie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 19 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 8 septembrie 2021 au permis plata a 7 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Cehia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 7,7 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Cehia a prezentat Comisiei, la 30 iunie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, precum și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, de eficiența energetică și de infrastructura feroviară. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Cehia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Cehiei urmărește să abordeze principalele provocări legate de transformarea digitală, tranziția verde, educație și piața forței de muncă, administrația publică, cercetarea și inovarea și asistența medicală. Acesta constă în 37 de reforme și 85 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de peste 7 miliarde EUR, reprezentând peste 3 % din PIB-ul din 2021 pentru a ajuta țara să facă față provocărilor sociale și economice presante. La 28 septembrie 2021, Comisia a plătit Cehiei 915 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Deși planul de redresare și reziliență al Cehiei este în curs de implementare, există însă riscul unor întârzieri. Cehia a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 37 de jaloane și ținte din plan și care a rezultat într-o plată globală de 928 de milioane EUR la 22 martie 2023. Cele 37 de jaloane și ținte aferente vizează reformele programelor școlare pentru promovarea alfabetizării digitale și a competențelor digitale, e-sănătatea, sistemul de audit și control al țării pentru implementarea MRR și legea privind înregistrarea beneficiarilor reali, precum și investițiile pentru reconstrucția a trei poduri feroviare, 45 de treceri la nivel feroviar mai sigure și instrumente digitale pentru educație. Sunt necesare îmbunătățiri suplimentare ale capacității administrative și stabilirea priorităților în ceea ce privește reformele și investițiile esențiale pentru implementarea la timp a planului.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Cehia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Cehia

➤ Reformă

O nouă lege privind construcțiile a intrat în vigoare în Cehia la sfârșitul lunii septembrie 2021. Acest jalon face parte dintr-o reformă care urmărește să aducă un grad ridicat de digitalizare în procesul general de autorizare a construcțiilor. Prin digitalizare, legea a accelerat procesul de acordare a autorizațiilor de construire și a redus numărul autorităților de reglementare implicate. Astfel, este mai puțin probabil ca întreprinderile de construcții să fie nevoite să investească o cantitate disproporționată de timp și resurse pentru a primi o autorizație. Numărul redus de autorități de reglementare contribuie, de asemenea, la stabilirea bazelor pentru punerea în aplicare a unor noi sisteme informatice și instrumente digitale în activitatea lor.


➤ Investiție

Cehia a realizat o investiție importantă pentru a preveni excluziunea digitală prin asigurarea accesibilității echipamentelor digitale pentru toți elevii. Aceasta a oferit finanțare pentru echipamente TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) pentru învățământul la distanță în școli, pentru a permite învățarea la distanță. Un alt obiectiv major al acestei investiții este dotarea școlilor cu tehnologii digitale de bază și avansate pentru a sprijini alfabetizarea digitală și învățarea modernă. Școlile vor beneficia, de asemenea, de asistență tehnică prin intermediul unui site dedicat, al unor seminare online și al unei noi rețele de referenți IT.

Aproape 10 000 de grădinițe și școli vor fi echipate cu tehnologii precum instrumente de realitate augmentată și de realitate virtuală, echipamente de robotică și imprimante 3D




Figura 6: Plată per pilon – Cehia

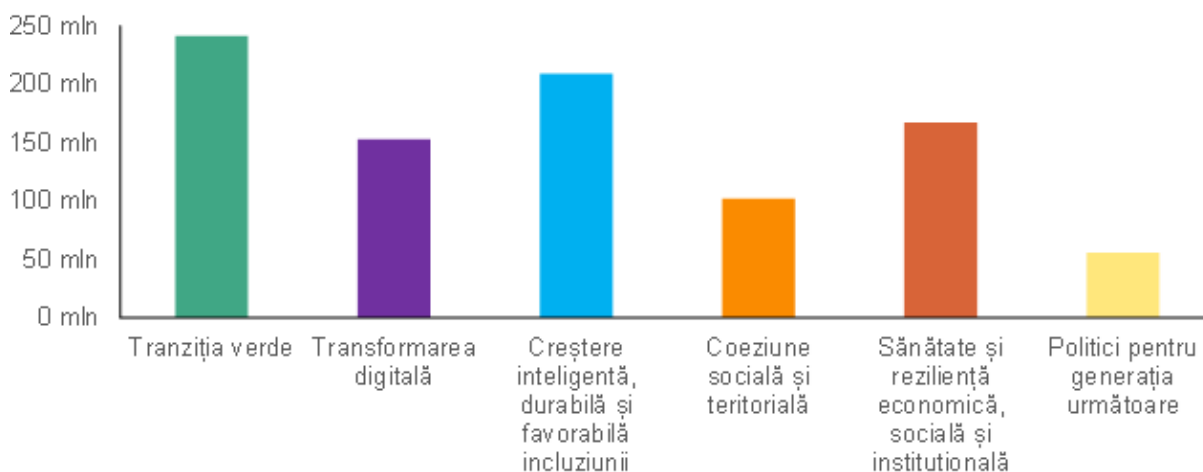

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 7: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Cehia



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 8: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Cehia

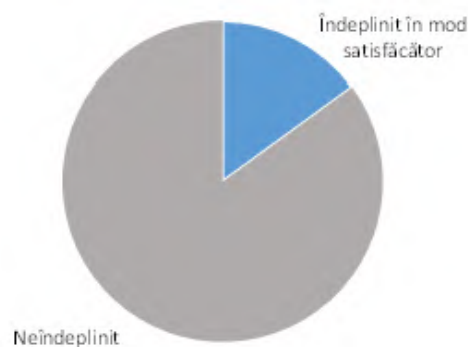

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Danemarca

Danemarca și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 17 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 1,55 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Danemarca a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 1,43 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Danemarca a prezentat, la 31 mai 2023, cererea sa de adăugare a unui capitol privind REPowerEU la planul său de redresare și reziliență, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, de dezvoltarea competențelor verzi, de captarea și stocarea carbonului și de înlocuirea în continuare a centralelor alimentate cu combustibil și a celor alimentate cu gaz. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Danemarca este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Danemarcei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și digitală și să consolideze reziliența sectorului sănătății. Acesta constă în 10 reforme și 42 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 1,43 miliarde EUR, reprezentând 0,46 % din PIB. La 2 septembrie 2021, Comisia a plătit Danemarcei 202 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Planul de redresare și reziliență al Danemarcei este în curs de implementare. Danemarca a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 25 de jaloane și ținte din plan și care a rezultat într-o plată globală de 301 milioane EUR la 27 aprilie 2023. Cele 23 de jaloane și 2 ținte aferente vizează reformele și investițiile în decarbonizarea agriculturii, digitalizarea asistenței medicale, reforma fiscală verde, taxele pe emisiile generate de industrie, impozitarea vehiculelor, mobilitatea durabilă, precum și cercetarea, dezvoltarea și inovarea. După prima cerere de plată, implementarea planului este în desfășurare, ceea ce va conduce la prezentarea celei de a doua plăți programate până la sfârșitul anului 2023.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Danemarca și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Danemarca

➤ Reformă

O reformă fiscală verde urmărește să revigoreze investițiile verzi ale întreprinderilor prin stimulente fiscale. Aceasta va crește impozitarea energiei și, în cele din urmă, va introduce o taxă uniformă pe emisiile de gaze cu efect de seră. Stimulentele suplimentare în ceea ce privește taxa pe investițiile întreprinderilor și creșterea ulterioară anunțată a impozitării energiei și a emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă stimulente puternice pentru creșterea investițiilor în eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect

de seră.

➤ **Investiție**


Danemarca a instituit un sistem de subvenții pentru a înlocui centralele alimentate cu combustibil și centralele alimentate cu gaz din gospodăriile private cu pompe electrice de căldură sau cu sisteme de termoficare. Sistemul de subvenții acoperă o parte din costurile de înlocuire a centralelor alimentate cu combustibil/gaz din gospodăriile private existente și de instalare, în schimb, a pompelor electrice de căldură electrice sau a accesului la sistemul de termoficare. Acest lucru contribuie la reducerea consumului de combustibili fosili (petrol și gaze), accelerând totodată tranziția verde către o utilizare sporită a surselor de energie durabile (cum ar fi energia eoliană sau solară sau sistemele de termoficare).

Instalații offshore care furnizează energie durabilă, sprijinite prin măsuri din planul de redresare și reziliență



Drepturi de autor: Comisia Europeană


Figura 9: Plată per pilon – Danemarca

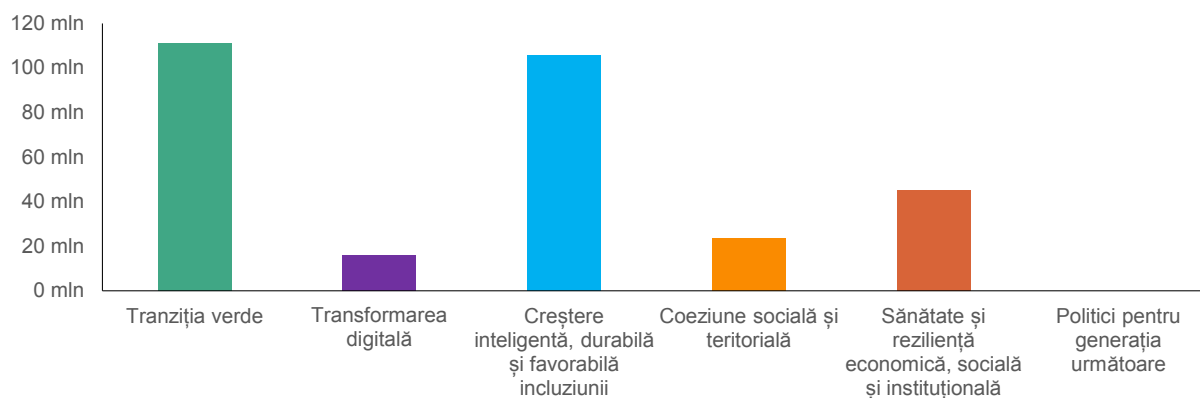

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclude prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 10: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Danemarca



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 11: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Danemarca

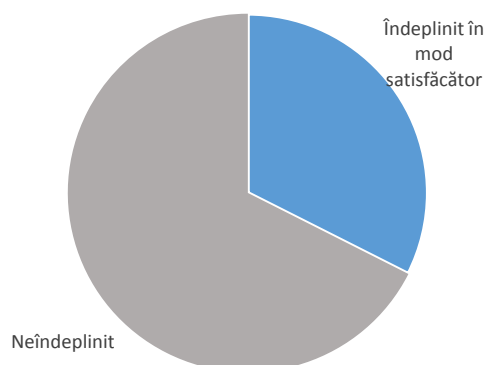

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Germania

Germania și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 28 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 22 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 25,6 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Germania a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 28 de miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Germania a prezentat Comisiei, la 9 decembrie 2022, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Actualizarea planului Germaniei a fost de natură tehnică. Aceasta a vizat două măsuri din planul Germaniei, una legată de digitalizarea căilor ferate (din cauza întârzierilor excepționale în ceea ce privește lucrările de construcție, data de finalizare a acestora a trebuit amânată), iar cealaltă de cercetarea și dezvoltarea vaccinurilor împotriva SARS-CoV-2 (modificarea jaloanelor din cauza incertitudinii în ceea ce privește rezultatele C&D). Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Consiliu la 14 februarie 2023, pentru o alocare totală de 26,4 miliarde EUR. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentat niciun capitol privind REPowerEU.

Planul de redresare și reziliență actual al Germaniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și digitală, de îmbunătățirea sistemului său de învățământ, a asistenței medicale și a administrației publice. Acesta constă în 15 reforme și 25 de investiții care beneficiază de finanțare în valoare de 26,4 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil, reprezentând 0,8 % din PIB. La 26 august 2021, Comisia a plătit Germaniei 2,25 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 9 % din alocarea financiară (inițială).


Planul de redresare și reziliență al Germaniei sprijină cetățenii să treacă la vehicule electrice nepoluante, oferind sprijin financiar pentru achiziționarea a peste 560 000 de vehicule care nu generează emisii de CO₂.



Planul de redresare și reziliență al Germaniei este în curs de implementare, însă cu întârzieri semnificative. Resursele limitate afectate implementării planului și prioritizarea insuficientă au făcut ca Germania să rămână în urmă în ceea ce privește procesul de implementare. Germania tocmai a semnat acordurile operaționale și este pe punctul de a depune prima sa cerere de plată. Această cerere ar urma să vizeze 36 de jaloane și fiște care urmăresc progresele înregistrate la nivelul tuturor componentelor planului de redresare și reziliență, ceea ce ar putea conduce la o plată de până la 4 miliarde EUR.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Germaniei.


Figura 12: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Germania

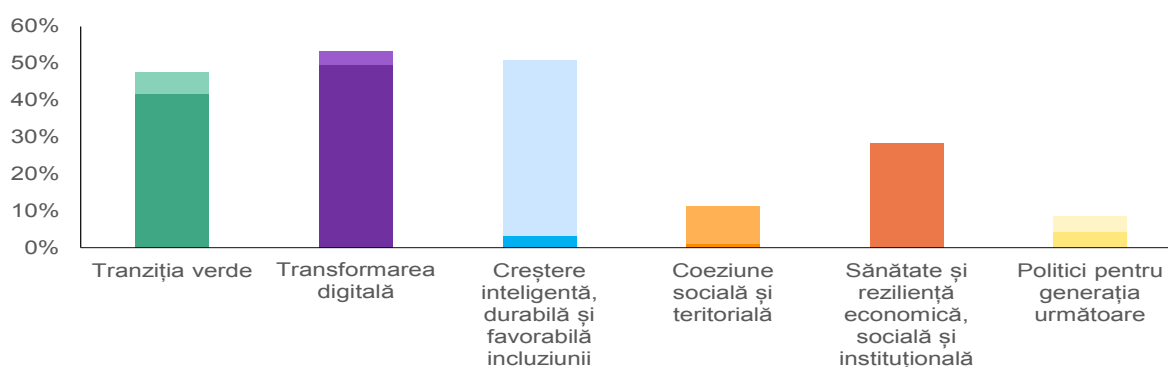

Notă: Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 13: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Germania



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Estonia

Estonia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 18 iunie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 5 octombrie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 29 octombrie 2021 au permis plata a 969,3 miliarde EUR în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Estonia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 863,5 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Estonia a prezentat Comisiei, la 9 martie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență modificat a inclus, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu o reformă suplimentară a sistemului de autorizare a energiei din surse regenerabile și două noi investiții pentru consolidarea rețelei de energie electrică și creșterea producției și a utilizării biogazului și biometanului durabile. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 12 mai 2023 și de Consiliu la 16 iunie 2023.

Planul de redresare și reziliență actual al Estoniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde, inclusiv eficiența energetică și transportul durabil, tranziția digitală în sectorul public și privat, precum și sănătatea și protecția socială. Acesta constă în 28 de investiții și 17 reforme care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 953 de milioane EUR și aproximativ 3,03 % din PIB. Până în prezent, la 17 decembrie 2021, suma de 126,01 milioane EUR a fost plătită Estoniei în cadrul MRR sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară inițială.

Construcția în curs a liniei de tramvai din Portul Vechi din Tallinn, finanțată prin MRR




Drepturi de autor: Comisia Europeană

Planul de redresare și reziliență al Estoniei este în curs de implementare. Din cauza inflației ridicate și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare cauzate de războiul din Ucraina, câteva investiții au fost amânate sau întrerupte, ceea ce a dus la revizuirea planului inițial. La 30 iunie 2023, Estonia a prezentat prima cerere de plată compusă din prima și a doua tranșă și corespunzând unui număr de 29 de jaloane și unei ținte din plan. Evaluarea de către Comisie a cererii de plată este în curs la momentul elaborării prezentului raport.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Estoniei.


Figura 14: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Estonia

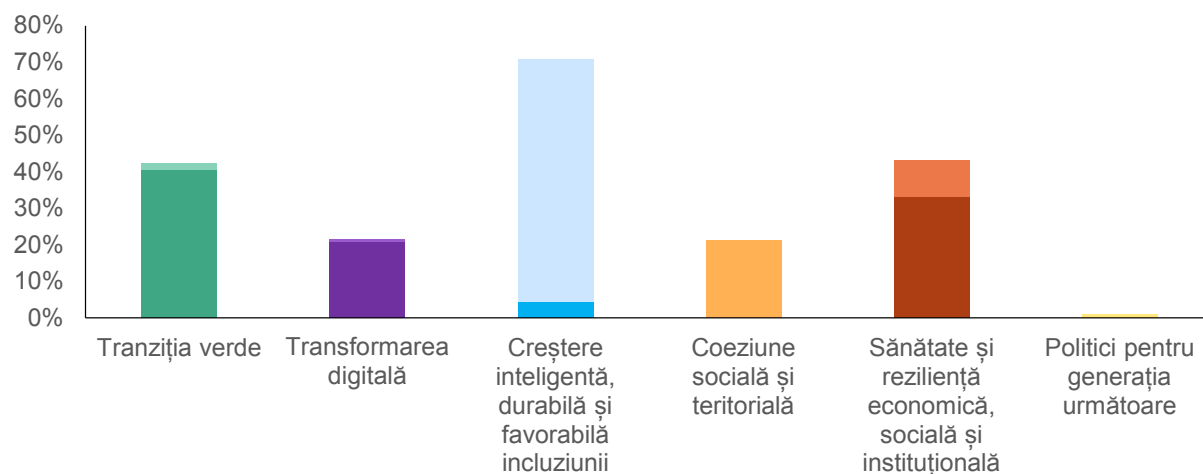

Notă: Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 15: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Estonia

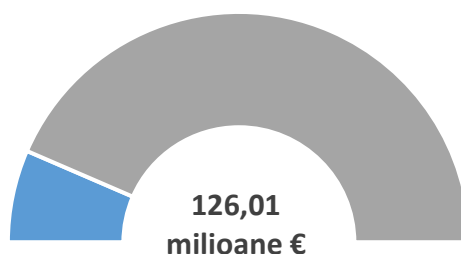

Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea.

Notă: Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Irlanda

Irlanda și-a prezentat planul de redresare și reziliență inițial la 25 mai 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 16 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 8 septembrie 2021 au permis plata a 989 de milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Irlanda a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 914 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Irlanda a prezentat Comisiei, la 22 mai 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Actualizarea planului Irlandei a fost de natură tehnică și a fost adoptată de Consiliu la 14 iulie 2023. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentat niciun capitol privind REPowerEU.

Planul de redresare și reziliență actual al Irlandei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, precum și de redresarea socială și economică. Acesta constă în 9 reforme și 16 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 914 milioane EUR, reprezentând 0,21 % din PIB-ul din 2021.

Pistă pentru biciclete nou-construită care beneficiază de sprijin din partea MRR




Planul de redresare și reziliență al Irlandei este în curs de implementare, însă cu întârzieri semnificative. Resursele limitate și prioritizarea insuficientă au făcut ca Irlanda să rămână

în urmă în procesul de implementare. Prima cerere de plată, care corespunde unui număr de 41 de jaloane și ținte din plan, este în curs de pregătire.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Irlandei.

Figura 16: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Irlanda

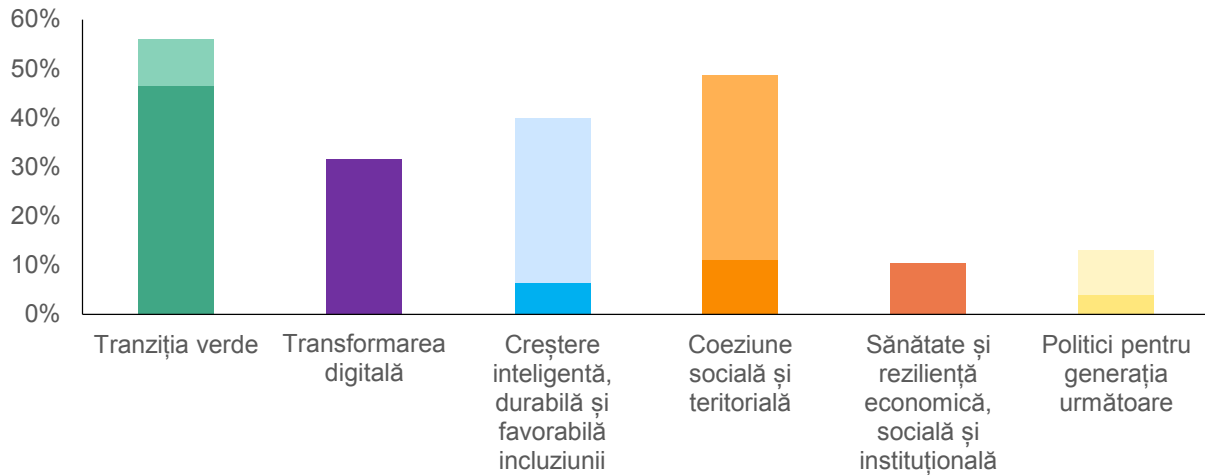

Notă: Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Grecia

Grecia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 27 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 17 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 17,8 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și a 12,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Grecia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 17,4 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Grecia a prezentat Comisiei, la 31 august 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de lucrările de reabilitare energetică pentru gospodării, întreprinderi și utilități, crearea unei piețe pentru hidrogenul din surse regenerabile, biometanul și captarea, utilizarea și stocarea carbonului, adoptarea sporită a surselor regenerabile de energie, cu măsuri de promovare a stocării energiei, precum și reforme care promovează energia eoliană offshore și tranziția către o rețea inteligentă și partajarea energiei. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Grecia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Greciei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, de ocuparea forței de muncă, de competențe și de coeziunea socială, de investițiile private și de transformarea economică și instituțională. Acesta constă în 68 de reforme și 106 investiții care beneficiază de sprijin în valoare de 17,4 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și de 12,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi, reprezentând 14,5 % din PIB în 2022. La 9 august 2021, Comisia a plătit Greciei 3,96 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Până în prezent, implementarea planului de redresare și reziliență al Greciei a fost în plină desfășurare, însă se confruntă cu unele provocări în viitor. Grecia a prezentat trei cereri de plată pentru sprijin financiar nerambursabil și două cereri de plată pentru sprijin sub formă de împrumut, care corespund unui număr de 85 de jaloane și ținte din plan. A treia cerere de plată în valoare de 1,72 miliarde EUR a fost depusă la 16 mai 2023 și este în curs de evaluare de către Comisie la momentul elaborării prezentului raport anual. Până în prezent, Grecia a primit o plată totală de 7,1 miliarde EUR pentru două cereri de plată aprobate, excluzând prefinanțarea. Deși Grecia a avut un început în forță, există riscuri substanțiale în viitor, ceea ce justifică depunerea unor eforturi continue de menținere și consolidare a ritmului de implementare. Planul conține un număr semnificativ de reforme și investiții care, prin amploarea sa, reprezintă o sarcină administrativă considerabilă. În această etapă, implementarea planului ajunge la o fază care se va baza pe administrațiile regionale și locale, a căror capacitate administrativă și de implementare este, în general, slabă.

Finalizarea unei serii de măsuri din cadrul planului necesită o serie de etape pregătitoare, inclusiv proceduri de achiziții publice. Asigurarea unor progrese în timp util ale acestora va necesita o coordonare solidă și continuă a organismelor locale și regionale de punere în aplicare, precum și asistență solidă și continuă acordată acestora.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Grecia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Grecia

➤ Reformă

Grecia a adoptat o reformă menită să raționalizeze cadrul de acordare a licențelor pentru sursele regenerabile de energie, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, asigurarea unor intervale de timp de răspuns administrativ mai scurte și obligatorii și a unor proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducând în același timp documentația și procedurile necesare. Reforma include crearea unui serviciu de ghișeu unic în cadrul Ministerului Mediului, însărcinat cu menținerea supravegherii întregului proces de acordare a licențelor. În plus, o platformă digitală va conecta toate subsistemele și bazele de date ale organismelor implicate în procesul de autorizare, permițându-le să comunice mai bine între ele și cu investitorii. Reforma va ajuta Grecia să reducă durata medie de acordare a licențelor pentru energia din surse regenerabile de la 5 ani la 14 luni și să dezvolte cel puțin 3,5 GW de stocare a energiei până în 2030.

Noi capacități fotovoltaice se vor dezvolta în Grecia datorită reformei sistemului de autorizare a energiei din surse regenerabile sprijinit de MRR




➤ Investiție

Planul de redresare și reziliență al Greciei pune la dispoziție împrumuturi în valoare de 12,7 miliarde EUR pentru a oferi finanțare întreprinderilor și pentru a sprijini investițiile private în domeniul tranziției verzi, al digitalizării, al creșterii capacității de export, al economiilor de scară și al inovării. Pentru a canaliza această finanțare către

sectorul privat, Grecia a instituit facilitatea de împrumut. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea cadrului său de guvernare, precum și prin acordurile semnate cu instituțiile financiare internaționale și prin apelurile către băncile comerciale, care sunt parteneri de implementare. Acest cadru prevede garanții solide pentru a asigura bonitatea financiară a întreprinderii împrumutate, viabilitatea financiară a proiectelor, rambursarea fondurilor și respectarea tuturor cerințelor stabilite în planul de redresare și reziliență al Greciei. Facilitatea de împrumut oferă lichidități substanțiale sectorului privat, cu angajamentul instituțiilor financiare de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și cel puțin 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală. Odată cu semnarea unor contracte de împrumut în valoare de cel puțin 586,4 milioane EUR între instituțiile financiare și investitori, Grecia a îndeplinit, înainte de termen, primul obiectiv din cadrul facilității de împrumut.


Figura 17: Plată per pilon – Grecia

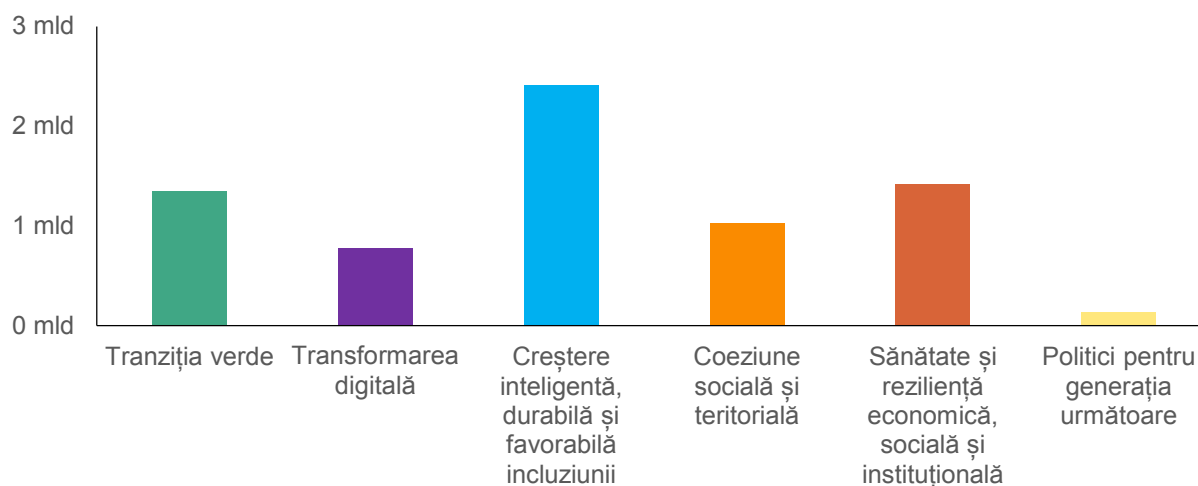

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 18: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Grecia



Notă: Acest grafic prezintă cantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 19: Total împrumuturi plătite în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Grecia



Notă: Acest grafic prezintă cantumul împrumuturilor plătite până în prezent în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Împrumuturile sunt contribuții financiare rambursabile. Cantumul total al împrumuturilor acordate fiecărui stat membru este determinat de evaluarea cererii de împrumut și nu poate depăși 6,8 % din VNB-ul pe 2019.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 20: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Grecia

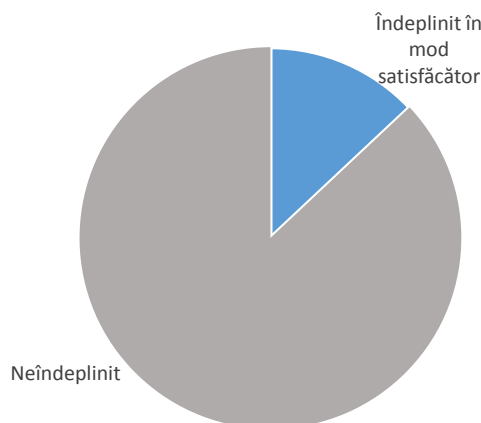

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Spania

Spania și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 16 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 69,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Spania a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 77,2 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Spania a prezentat Comisiei, la 6 iunie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare menite să accelereze și mai mult decarbonizarea economiei sale. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Spania este în curs la momentul elaborării prezentului raport.

Planul de redresare și reziliență inițial (și actual) al Spaniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde, de tranziția digitală și de reziliența economică și socială. Acesta constă în 102 reforme și 112 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 69,5 miliarde EUR, reprezentând 6,5 % din PIB. La 17 august 2021, Comisia a plătit Spaniei 9 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Până în prezent, implementarea planului de redresare și reziliență al Spaniei a fost în plină desfășurare, însă se confruntă cu unele provocări în viitor. Spania a prezentat 3 cereri de plată, corespunzând unui număr de 121 de jaloane și ținte din plan și având drept rezultat o plată globală în valoare de 28 de miliarde EUR. Măsurile din planul de redresare și reziliență puse în aplicare până în prezent includ reforme ale pieței forței de muncă, un prim set de reforme ale pensiilor, modernizarea Agenției de Administrare Fiscală și prevenirea fraudei fiscale, aprobarea Strategiei în domeniul sănătății publice, precum și o revizuire a Legii privind insolvența, a Legii privind știința, tehnologia și inovarea, a Legii privind telecomunicațiile, a Legii privind sistemul integrat de formare profesională și a Legii generale privind comunicarea audiovizuală. Pe baza datelor publicate de autoritățile spaniole, investițiile sprijinite de planul de redresare și reziliență sunt în plină desfășurare, iar 76 % din fondurile MRR în valoare de peste 50 de miliarde EUR înscrise în bugetul pentru 2021 și 2022 fuseseră angajate până la sfârșitul anului 2022. Suma de 20,6 miliarde EUR a fost transferată către regiuni pentru a implementa investiții în cadrul planului de redresare și reziliență. Deși Spania s-a numărat printre cele mai avansate state membre în ceea ce privește implementarea planului, în prezent se așteaptă ca aceasta să îl revizuiască astfel încât dimensiunea sa să se dubleze. Acest lucru ar trebui să fie însoțit de o capacitate

administrativă consolidată suficientă pentru a se asigura absorbția eficace și eficientă a fondurilor pentru redresare și reziliență și a altor fonduri disponibile la nivelul UE și la nivel național.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Spania și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Spania

➤ Reformă

Spania și-a modificat legislația în temeiul planului de redresare și reziliență cu scopul de a limita utilizarea contractelor temporare la cazuri justificate în mod corespunzător și de a generaliza utilizarea contractelor pe durată nedeterminată. Piața forței de muncă din Spania se caracterizează prin niveluri ridicate de ocupare temporară a forței de muncă. Reforma pieței forței de muncă aprobată în decembrie 2021 contribuie la reducerea ocupării temporare a forței de muncă în sectorul privat. Noile contracte semnate în 2022 indică o reducere generalizată a ponderii contractelor pe durată determinată, aceasta scăzând în ansamblu la 62 %, de la 90 % în 2019. Ponderea angajaților temporari din sectorul privat a scăzut la 14,8 % în T4 2022, de la 23,9 % în T4 2021.

➤ Investiție


Spania a aprobat un program de îmbunătățire a competențelor digitale în domeniul educației (denumit #CompDigEdu) și un program pentru digitalizarea sistemului de învățământ. Aceste programe vor dota cel puțin 240 000 de săli de clasă, vor forma 700 000 de profesori și vor pregăti sau revizui strategia digitală pentru cel puțin 22 000 de centre școlare publice și subvenționate din fonduri publice și vor furniza 300 000 de dispozitive digitale conectate (laptopuri, tablete) în școli publice și subvenționate din fonduri publice, în cooperare cu comunitățile autonome.

Centrul de excelență profesională Tknika este sprijinit de MRR



Drepturi de autor: Comisia Europeană


Figura 21: Plată per pilon – Spania

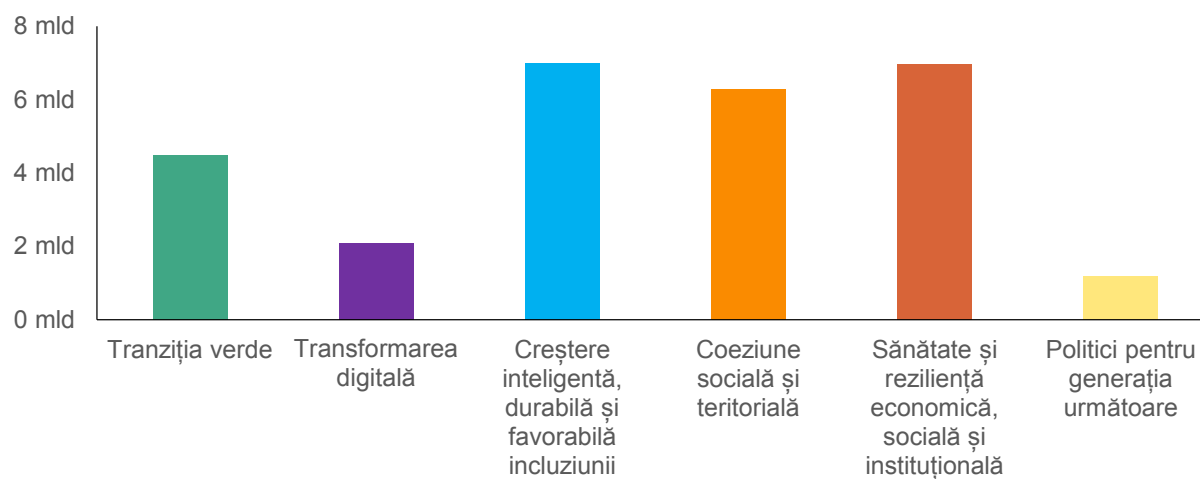

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țințelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 22: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Spania



Notă: Acest grafic prezintă cantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 23: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Spania

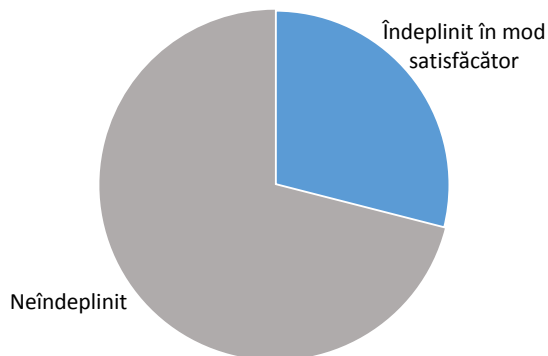

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Franta

Franta și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 29 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 23 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 39,4 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Franța a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 37,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Franța a prezentat Comisiei, la 20 aprilie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit a inclus, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, eficiența energetică, industria cu zero emisii nete și hidrogenul fără combustibili fosili. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 26 iunie 2023 și de Consiliu la 14 iulie 2023.

Planul de redresare și reziliență actual al Franței urmărește să accelereze tranziția verde și cea digitală, să sporească potențialul de creștere și să consolideze coeziunea. Planul constă în 24 de reforme și 73 de investiții care vor beneficia de sprijin nerambursabil în valoare de 40,3 miliarde EUR (1,6 % din PIB). În luna august 2021, Comisia a plătit Franței 5,1 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Planul de redresare și reziliență al Franței este în curs de implementare. Franța a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 38 de jaloane și ținte din plan și având drept rezultat o plată globală de 7 400 000 EUR la 4 martie 2022. Aceasta vizează reforme în domeniul finanțelor publice, al schimbărilor climatice, al locuințelor, al mobilității, al pieței forței de muncă, al competențelor și al sănătății. Mai multe ținte se referă la investiții majore în domeniul renovării energetice a clădirilor, al decarbonizării industriei, al vehiculelor nepoluante, al cercetării, al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și al educației. De asemenea, Franța a prezentat o a doua cerere de plată în valoare de peste 10,3 miliarde EUR la 31 iulie 2023, corespunzând unui număr de 55 de jaloane și ținte din plan. Comisia evaluează a doua cerere de plată a Franței la momentul elaborării prezentului raport anual.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Franța și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Renovarea termică a unei locuințe studențești istorice în Cité Internationale Universitaire din Paris.



Drepturi de autor: Comisia Europeană

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Franța

➤ ***Reformă***


Franța a introdus o lege privind clima și reziliența, adoptată la 20 iulie 2021, pentru a respecta obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. Se preconizează că această reformă va conduce la o reducere estimată între 56 și 74 de milioane de tone de echivalent CO2 în total.

➤ ***Investiție***

Franța introduce subvenții pentru angajarea tinerilor sub 26 de ani. MRR finanțează 84 % din subvențiile pentru angajarea tinerilor sub 26 de ani. Angajatorii care angajează un tânăr cu vârsta sub 26 de ani primesc până la 4 000 EUR pe an pentru un contract cu normă întreagă. În contextul planului de redresare și reziliență al Franței, 337 000 de tineri au beneficiat de schemă până la jumătatea anului 2021. Această schemă de sprijin este una dintre măsurile-cheie ale planului pentru tineret „1 jeune, 1 solution”, lansat în vara anului 2020 pentru a oferi fiecărui tânăr din țară o soluție adecvată care să răspundă

nevoilor sale, fie că este vorba de educație, formare sau ocuparea unui loc de muncă, îndrumare sau sprijin financiar.


Figura 24: Plată per pilon – Franța

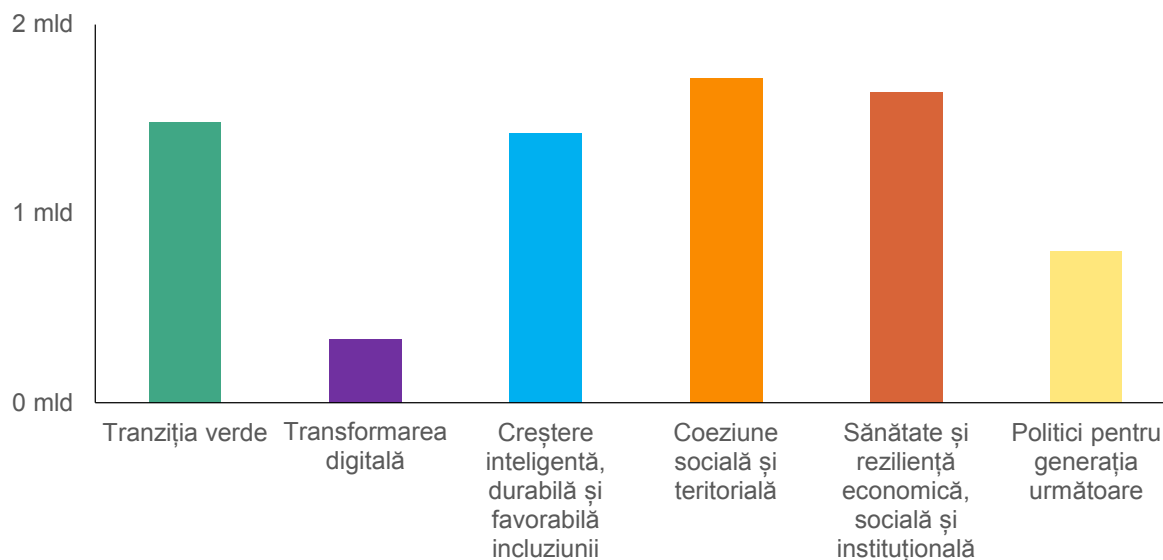

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 25: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Franța



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 26: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Franța

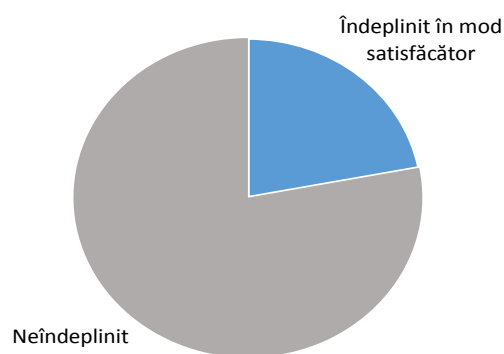

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

[and-resilience-scoreboard/country_overview.html](#)

Croația

Croația și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 14 mai 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 8 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 28 iulie 2021 au permis plata a 6,3 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Croația a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 5,51 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Croația a prezentat Comisiei, la 31 august 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare și extinse legate de securitatea energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, eficiența energetică a clădirilor, transporturile și hidrogenul din surse regenerabile. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Croația este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Croației urmărește să abordeze principalele provocări legate de accelerarea tranziției digitale și a celei verzi, de consolidarea rezilienței economice și sociale și de construirea unei administrații publice mai eficiente. Acesta constă în 76 de reforme și 146 de linii de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 5,51 miliarde EUR, reprezentând 9,5 % din PIB-ul din 2021. La 28 septembrie 2021, Comisia a plătit Croației 818,4 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Planul de redresare și reziliență al Croației este în curs de implementare. Croația a prezentat trei cereri de plată, care corespund unui număr de 104 jaloane și ținte din plan. Până în prezent, au fost aprobate două cereri de plată corespunzătoare unui număr de 59 de jaloane și ținte, ceea ce a dus la o plată totală de 1,4 miliarde EUR. A treia cerere de plată în valoare de 700 de milioane EUR a fost depusă la 24 iulie 2023 și este în curs de evaluare de către Comisie la momentul elaborării prezentului raport anual. În acest stadiu de implementare a planului, măsurile constau în mare parte în adoptarea documentelor-cadru strategice naționale (legislație, strategii, programe revizuite sau noi) pentru a deschide calea către cheltuieli eficiente pentru investiții în cadrul tranșelor viitoare. O parte semnificativă din fondurile planului de redresare și reziliență este deja disponibilă în cadrul cererilor de propuneri de proiecte și al programelor de finanțare specifice.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țăintelor care trebuie atinse de Croația și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Croația

➤ Reformă

Croația a adoptat o nouă strategie anticorupție pentru perioada 2021-2030. Scopul său este de a consolida normele și instituțiile existente implicate în lupta împotriva corupției și de a spori transparența activității autorităților publice. De asemenea, va îmbunătăți sistemele de gestionare pentru a preveni conflictele de interese și pentru a sensibiliza publicul cu privire la prejudiciile cauzate de corupție și la necesitatea de a raporta neregulile.

➤ Investiție


Croația a atribuit 75 de contracte întreprinderilor mici, mijlocii și mari, pentru a spori eficiența energetică în procesele de producție industrială ale industriei prelucrătoare mari consumatoare de energie și pentru a spori utilizarea surselor regenerabile. În practică, investițiile vor îmbunătăți procesele de producție din industriile prelucrătoare pentru a reduce consumul de energie cu minimum 20 % până la 40 %, în funcție de tipul de investiție.

Panouri fotovoltaice finanțate prin MRR instalate pe acoperișul unui IMM din Voćin, județul Virovitica-Podravina



Drepturi de autor: Guvernul Republicii Croația


Figura 27: Plată per pilon – Croația

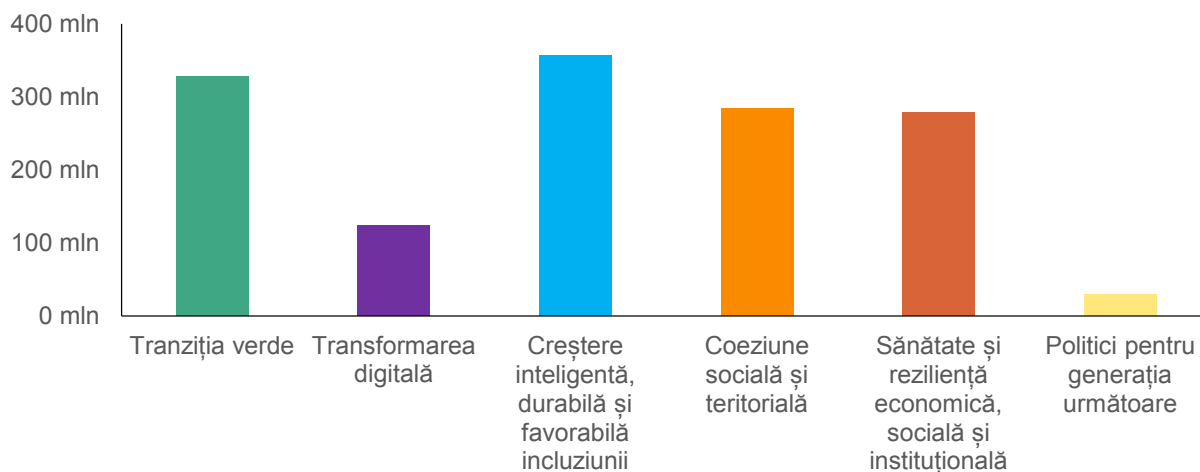

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclude prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 28: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Croația



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 29: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Croația

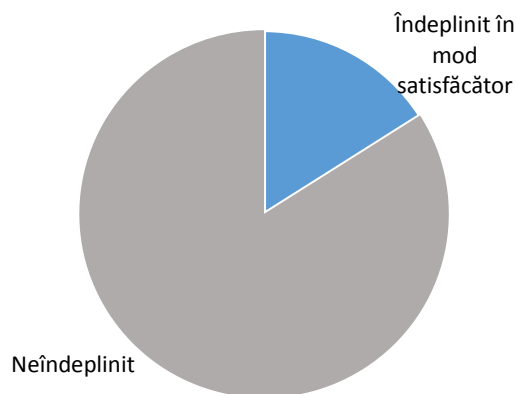

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare

și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Italia

Italia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 22 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 68,9 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și a 122,6 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Italia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 69 de miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Italia a prezentat Comisiei, la 11 iulie 2023 și, respectiv, la 7 august 2023, două planuri de redresare și reziliență modificate. Primul plan de redresare și reziliență modificat a fost prezentat pentru a modifica un set specific de jaloane și ținte incluse în cea de a patra cerere de plată, din cauza unor circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Prima actualizare a planului Italiei a fost de natură tehnică și a fost aprobată de Comisie la 28 iulie 2023, fiind prezentată Consiliului spre aprobare. Al doilea plan de redresare și reziliență modificat a fost prezentat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Al doilea plan de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, de competențele verzi, de eficiența energetică și de infrastructura de energie electrică. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Italia privind cel de al doilea plan este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

MRR va finanța investiții în valoare de 191,6 miliarde EUR în Italia în perioada 2022-2026 (10,7 % din PIB). Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Italiei constă în 132 de investiții și 58 de reforme. Italia este cel mai mare beneficiar al MRR în termeni absoluți. La 13 august 2021, Comisia a plătit Italiei 24,89 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Deși planul de redresare și reziliență al Italiei este în curs de implementarea, există însă un risc din ce în ce mai crescut al unor întârzieri. Italia a prezentat trei cereri de plată, care corespund unui număr de 151 de jaloane și ținte din plan și care au avut ca rezultat o plată totală de 42 de miliarde EUR (cu referire la primele două cereri de plată depuse). La 30 decembrie 2022, Italia a prezentat cea de a treia cerere de plată, pentru care evaluarea preliminară a fost aprobată de Comisie la 28 iulie 2023. Implementarea rapidă a planului și negocierea modificării acestuia sunt esențiale, având în vedere caracterul temporar al MRR în vigoare până în 2026.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Italia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Italia

➤ Reformă

Italia a continuat eforturile de reformare a administrației publice prin adoptarea tuturor actelor de punere în aplicare relevante privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public. Legislația primară a fost adoptată în 2022. Toate actele de punere în aplicare au intrat în vigoare. Această etapă va contribui la o gestionare mai eficientă și mai eficientă a forței de muncă din administrația publică italiană, de la recrutare până la avansarea în carieră. Actele de punere în aplicare sunt deosebit de relevante pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a reformei și pentru a contribui la o implementare omogenă la nivelul administrațiilor publice. Ar trebui remarcat faptul că Italia a anticipat deja unele acte secundare, care au fost adoptate cu mult înainte de termenul preconizat, pentru a încadra mai bine dispozițiile încorporate în legislația primară și având în vedere relevanța acestora pentru punerea în aplicare concretă a reformei.

➤ Investiție

Italia a finalizat cu succes proiectarea, pregătirea, instalarea și testarea a patru centre de date, care constituie nucleul unei noi infrastructuri naționale de cloud, denumită „Polo Strategico Nazionale” (PSN), dedicate găzduirii sistemelor informatice, a datelor și a aplicațiilor administrațiilor publice. Următoarele etape ale investiției vor viza migrarea către infrastructura de cloud a seturilor de date și a aplicațiilor a cel puțin 280 de administrații publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății.

MRR va sprijini investițiile în centrele de date pentru a spori capacitatea de cloud a Italiei.


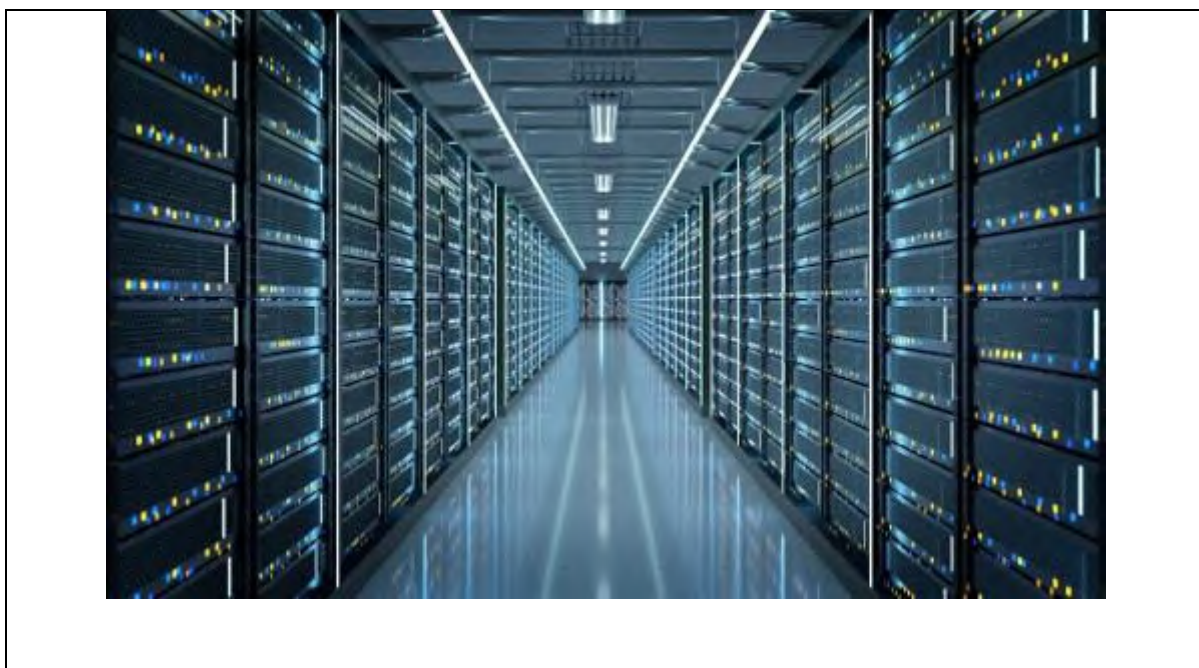


Figura 30: Plată per pilon – Italia

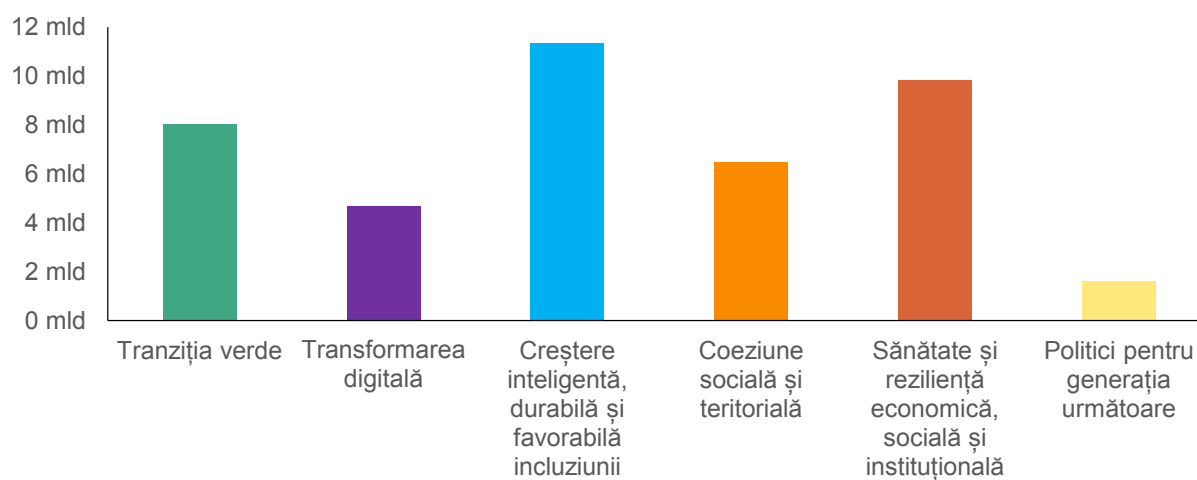


Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 31: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Italia

Figura 32: Total împrumuturi plătite în cadrul Mecanismului de redresare și

reziliență - Italia

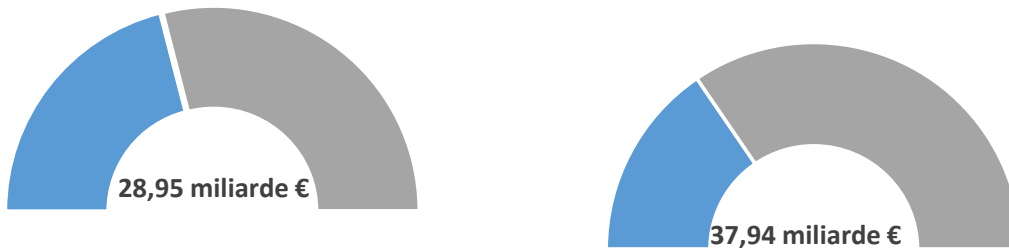


Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 33: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Italia

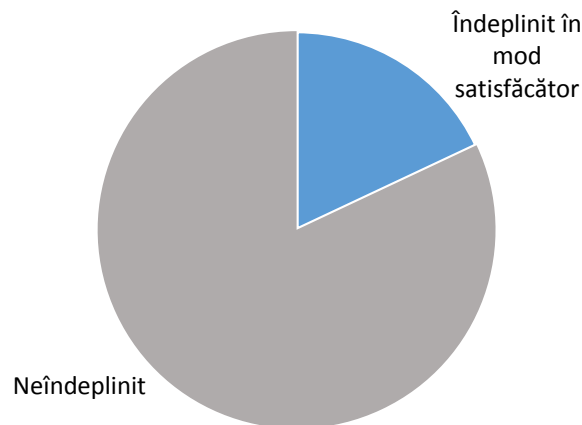

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Cipru

Cipru și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 17 mai 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 8 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 28 iulie 2021 au permis plata a 1 miliard EUR sub formă de sprijin nerambursabil și a 0,2 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Cipru a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 916 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Cipru a prezentat Comisiei, la 1 septembrie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare și extinse legate de eficiența energetică a clădirilor, de electrificarea transporturilor și de cercetarea și dezvoltarea în domeniul tranziției verzi. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Cipru este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Ciprului urmărește să abordeze principalele provocări legate de dubla tranziție (verde și digitală), de sănătatea publică și de protecția civilă și de creșterea rezilienței economice, sociale și instituționale. Acesta constă în 75 de investiții și 58 de reforme care beneficiază de sprijin în valoare de 916 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil și de 200 de milioane EUR sub formă de împrumuturi, reprezentând 4,1 % din PIB-ul din 2022 după actualizarea contribuției financiare maxime. În luna septembrie 2021, Comisia a plătit Ciprului 157 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

Deși planul de redresare și reziliență al Ciprului este în curs de implementare, există însă riscul unor întârzieri. La 2 decembrie 2022, Cipru a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 14 jaloane din plan și care a rezultat într-o plată globală în valoare de 85 de milioane EUR. Cele 14 jaloane aferente vizează măsuri în sectorul financiar și în administrația publică, precum și în domeniul pieței energiei electrice, al eficienței energetice, al economiei circulare, al combaterii corupției și al transparenței, al competențelor informatice și al auditului și controlului bugetar. Planul de redresare și reziliență al Ciprului are un caracter relativ amplu și complex. O guvernare solidă și monitorizarea continuă a PNRR sunt esențiale pentru a reduce la minimum riscul de întârzieri.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Cipru și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Cipru

➤ Reformă

În Cipru a intrat în vigoare o lege menită să protejeze de sancțiuni interne avertizorii de integritate care raportează cazurile de fraudă și corupție. Împreună cu intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității independente împotriva corupției și cu intrarea în vigoare a Legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe, aceasta asigură o mai mare coerență în lupta împotriva corupției.


Reforma sprijinită prin MRR va îmbunătăți lupta împotriva corupției în Cipru



➤ Investiție

Cipru a publicat o cerere de propuneri pentru o schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică, în special în IMM-uri și organizații non-profit, cu scopul de a reduce consumul de energie primară cu cel puțin 30 % și emisiile de CO2 din clădiri și/sau instalații. Intervențiile în materie de eficiență energetică vor fi puse în aplicare integral până la sfârșitul anului 2025.


Figura 34: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Cipru

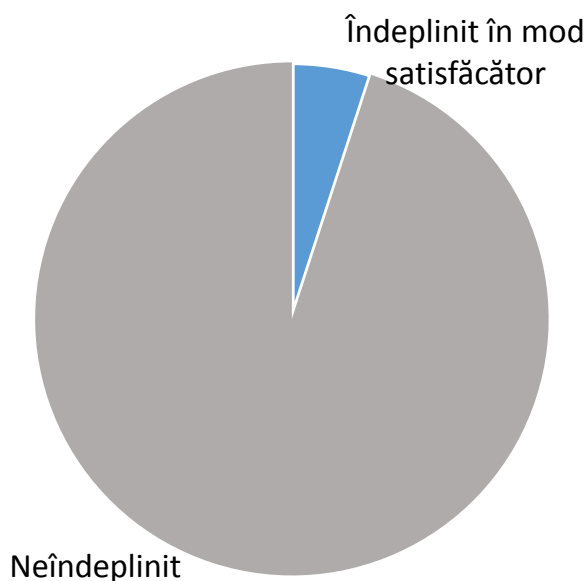

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 35: Plată per pilon – Cipru

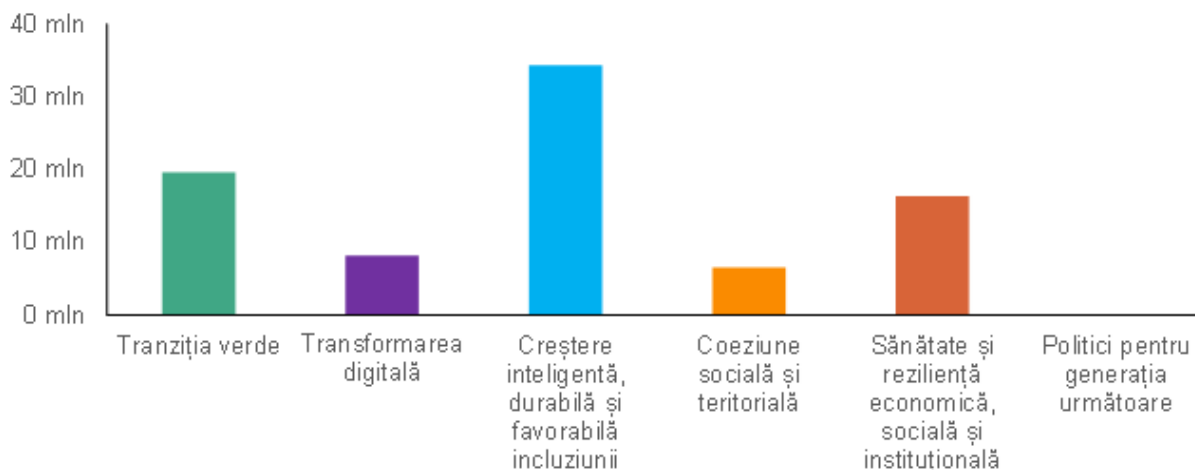

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 36: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Cipru




Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 37: Total împrumuturi plătite în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Cipru



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul împrumuturilor plătite până în prezent în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Împrumuturile sunt contribuții financiare rambursabile. Cuantumul total al împrumuturilor acordate fiecărui stat membru este determinat de evaluarea cererii de împrumut și nu poate depăși 6,8 % din VNB-ul pe 2019.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Letonia

Letonia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 22 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 1,8 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Letonia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 1,8 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentată nicio revizuire a planului.

Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Letoniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și digitală, inegalitățile regionale și sociale, asistența medicală, transformarea economică și statul de drept. Acesta constă în 24 de reforme și 61 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 1,8 miliarde EUR, reprezentând 5,58 % din PIB-ul Letoniei din 2021. La 10 septembrie 2021, Comisia a plătit Letoniei 237,4 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară inițială.

Planul de redresare și reziliență al Letoniei este în curs de implementare. La 7 octombrie 2022, Letonia a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de nouă jaloane din plan și având drept rezultat o plată globală în valoare de 201 milioane EUR. Cele nouă jaloane conexe acoperă reforme și investiții esențiale în domeniul sistemului de sprijin pentru venitul minim, al infrastructurii de bandă largă, al infrastructurii instituțiilor de învățământ și al învățării la distanță. Alte domenii vizate sunt achizițiile publice, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării, precum și construirea de locuințe cu chirie mică. A doua cerere de plată este scadentă în 2023 și va acoperi 49 de jaloane și ținte.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Letonia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Letonia

➤ Reformă

Letonia a îmbunătățit condițiile reformei venitului minim prin adoptarea unui cadru strategic pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de sprijin pentru venitul minim. Obiectivul general al acestei reforme este de a reduce inegalitatea, de a îmbunătăți plasa de siguranță socială, de a promova integrarea și incluziunea socială în Letonia. Reforma revizuește pragul venitului minim prin stabilirea acestuia la cel puțin 20 % din venitul median și prevede o procedură de indexare pozitivă care să aibă loc anual. Anterior, sistemul venitului minim avea praguri în termeni nominali care erau revizuite o dată la trei ani. Cadrul strategic a constat în patru părți, adoptate în perioada august 2021-martie

2022.


➤ **Investiție**

Letonia a oferit acces la conținutul educațional și a permis grupurilor vulnerabile din punct de vedere social să participe la învățarea la distanță. În 2021, a fost aprobat un cadru pentru organizarea și punerea în aplicare a învățării la distanță în instituțiile de învățământ. Investiția în planul de redresare și reziliență constă în achiziționarea de echipamente aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pentru instituțiile de învățământ general, cu sprijin specific pentru elevii din grupuri vulnerabile din punct de vedere social, profesori și crearea unei „biblioteci informatice” în instituțiile de învățământ. Letonia a adoptat deja regulamentele Cabinetului de Miniștri care stabilesc criteriile și condițiile pentru organizarea și desfășurarea învățării la distanță pentru a se asigura că învățarea la distanță este organizată și pusă în aplicare în toate instituțiile de învățământ și la toate nivelurile de învățământ letone. În următorii ani, Letonia va furniza echipamente TIC cursanților vulnerabili.

Cu sprijinul MRR, în 2021 a fost aprobat un cadru pentru organizarea și punerea în aplicare a învățării la distanță în instituțiile de învățământ.




Figura 38: Plată per pilon – Letonia

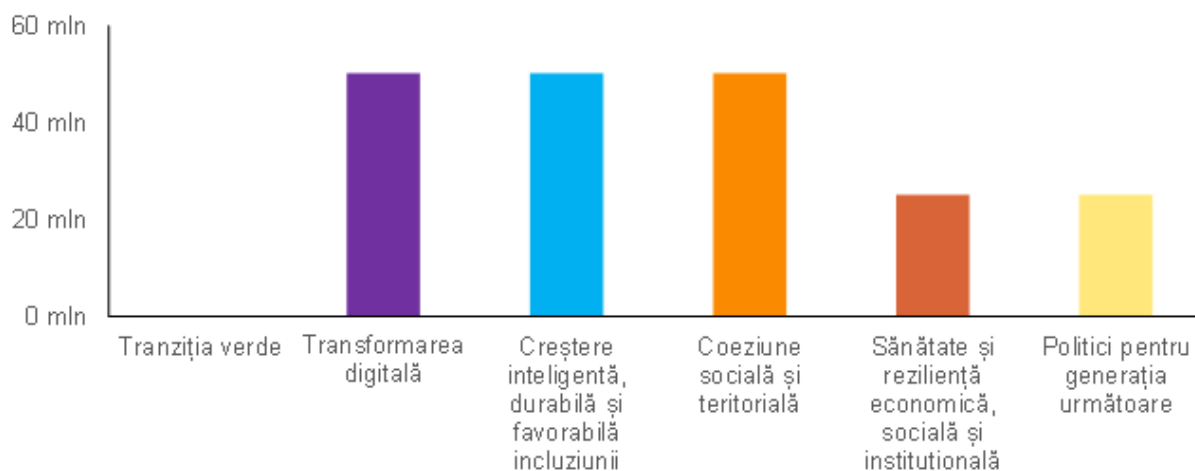

Notă: Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figura 39: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Letonia



Notă: Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figura 40: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Letonia

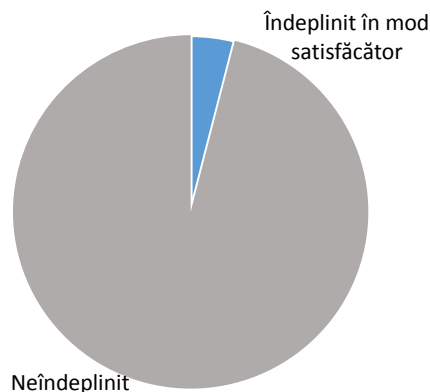

Notă: Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

Sursa: Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html
